


Pilotażowe wdrożenie randomizowanego instrumentu odpowiedzi – harmonogram projektu

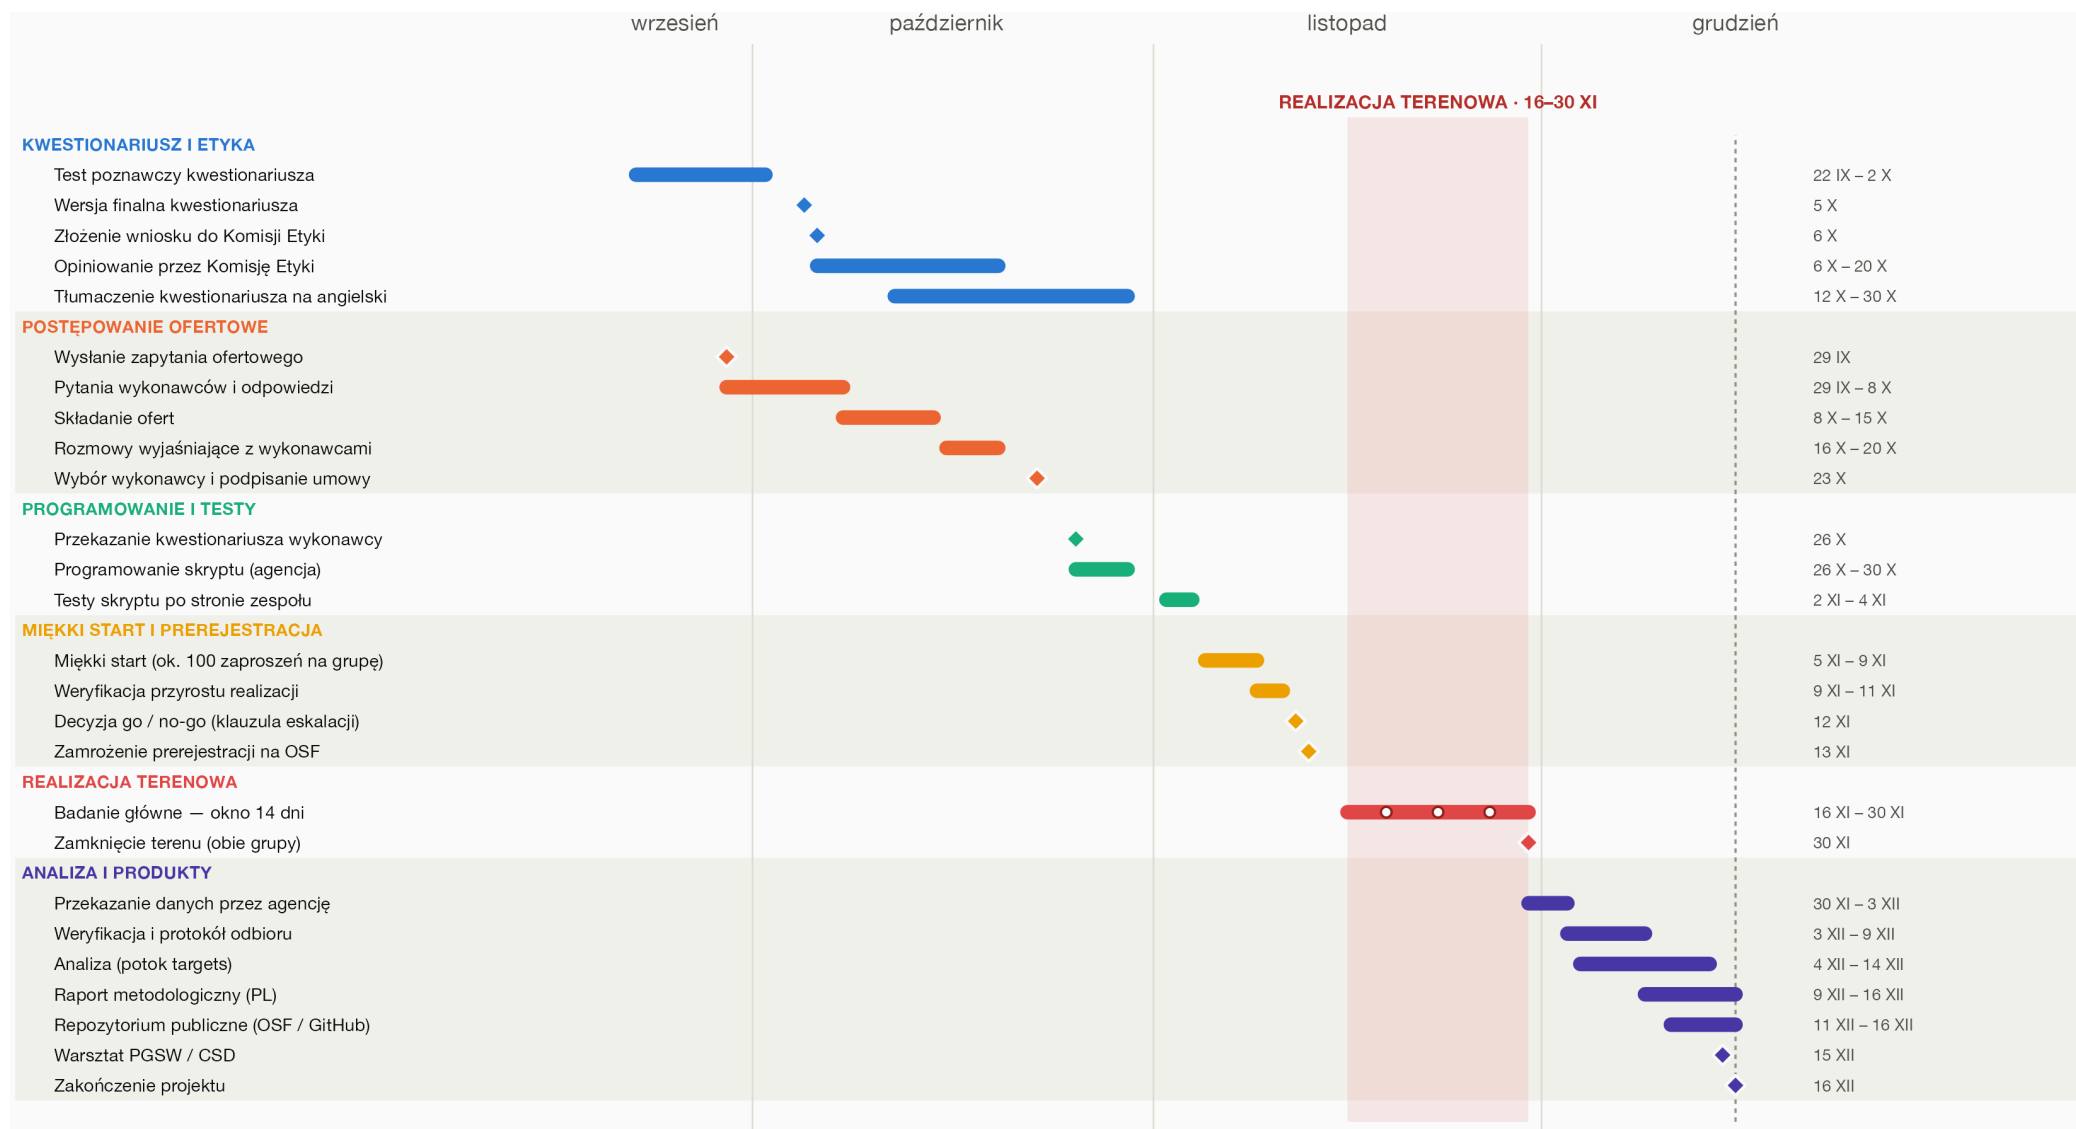

Oznaczenia. Romb — kamień milowy. Białe kropki na pasku badania głównego — zaproszenie i trzy przypomnienia (dni 0 / 3 / 7 / 11, tj. 16, 19, 23 i 27 XI). Różowe pole — 14-dniowe okno terenowe. Linia przerywana — koniec okresu realizacji projektu wg decyzji FRBN.

Punkt stały. Harmonogram zbudowano wstecz i wprzód od realizacji terenowej 16–30 XI. Poniedziałkowy start daje trzy przypomnienia w dni robocze i omija Święto Niepodległości (11 XI).

Do rozstrzygnięcia. Dane wracają 3 XII, a projekt kończy się 16 XII — na analizę, raport i warsztat zostaje 9 dni roboczych. Potok jest już zbudowany i przetestowany na symulacji, ale zapas czasu jest zerowy.
